

Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Jerico
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	08/08/2026
Dirección del punto / sector	Carrera 7 7 51-99, Jerico, Antioquia
Latitud	5.789998358218928
Longitud	-75.78536524612343
Coordenadas formulario	-75.79_5.79

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	Estacion de policia

Evidencia ubicación CCM



12 jul 2026 2:16:32 p. m.
5.790021666666666N 75.78553000000001W
6-49 Calle 7
Jerico
Antioquia
PUNTO: CCM

¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	MUNICIPIO
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO
Proveedor de la conexión del CCM:	Comandante de estación de Policía
¿Requiere actualización de conexión?	NO

¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	SI
Otro uso del espacio del CCM:	Guardia de la estacion de policia
Administrador del CCM:	Comandante de estacion
¿Personal de T.I. en sitio?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	REGULAR
Foto rack de comunicaciones	
	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	SI
Estado de los cables:	BUENO
¿Requiere cables?	SI
Tipo de cable requerido:	2N_12+1AGW
Observaciones cables:	Se requiere de 35 metros de cable 2N°12 + 1N°12 AWG, para el traslado del CCM
TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	SI
Estado tablero breaker:	BUENO

Foto tablero breaker



Existe breaker:	SI
Estado breaker:	BUENO
¿Requiere breaker?	SI
Tipo de breaker requerido:	BRK_20A
Cantidad breaker (un):	1
Observaciones tablero breaker:	Se requiere de 1 Breaker de 20A para el nuevo circuito electrico
🔧 TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
🔧 TUBERÍA	
Existe tubería:	NO
¿Requiere tubería?	SI
Tipo de tubería requerida:	EMT_3_4
Cantidad tubería EMT 3/4 (ml):	60
Observaciones tubería:	se requiere de la tuberia para llevar la FO y el circuito electrico
🔧 CORAZA	
Existe coraza:	NO
¿Requiere coraza 3/4?	NO
🔧 UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS



11 jul 2026 2:08:33 p. m.
5.7899528N 75.7854588W
7-13 Carrera 7
Jericó
Antioquia
PUNTO: CCM JERICÓ

¿Requiere UPS?	SI
Tipo de UPS requerida:	UPS_2_0
Observaciones UPS:	La UPS actual es de 1 KVA, y se necesita una de mayor capacidad que permita un mayor respaldo de tiempo en el CCM
BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	NO
¿Requiere baterías UPS?	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
¿Requiere SPT?	NO
PROTECCIÓN	
Existe protección:	NO
¿Requiere protección?	NO
PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	SI
Estado PDU multitoma:	BUENO

Foto PDU multitoma



¿Requiere PDU multitoma?	NO
TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	NO
¿Requiere toma 125 V?	SI
Cantidad toma 125 V (un):	1
CANALETA PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	NO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	NO

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA	
Existe punto físico de repetición:	SI
Estado punto físico de repetición:	BUENO
¿Requiere mantenimiento?	NO
PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	SI
Estado fibra óptica:	BUENO
¿Requiere fibra óptica?	NO
ODF	
Existe ODF:	NO
¿Requiere ODF?	NO
INYECTOR POE	
Existe inyector PoE:	SI
Estado inyector PoE:	BUENO

Foto inyector PoE



¿Requiere inyector PoE?	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe patch cord:	SI
Estado patch cord:	BUENO
¿Requiere patch cord?	NO
🔧 PATCH PANEL	
Existe patch panel:	NO
¿Requiere patch panel?	SI
¿Requiere toma RJ45?	NO
📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe organizador de cableado:	NO
¿Requiere organizador de cableado?	SI
Cantidad organizador de cableado (un):	4
🔄 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe convertidor monomodo:	SI
Estado convertidor monomodo:	BUENO

Foto convertidor monomodo



¿Requiere convertidor monomodo?

NO

 MÓDULO TRANSCPTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO

Existe módulo óptico:

NO

¿Requiere módulo óptico?

NO

 SWITCH

Existe switch:

SI

Estado switch:

BUENO

Foto switch



¿Requiere switch?

NO

 DISCO DURO

Existe disco duro:

NO

¿Requiere disco duro?

NO

 FIREWALL

Existe firewall:

NO

¿Requiere instalación de firewall?	NO
ENRUTADOR VPN	
Existe enrutador VPN:	SI
Estado enrutador VPN:	BUENO

Foto enrutador VPN



EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe equipo TX/RX:	SI
Estado equipo TX/RX:	BUENO
¿Requiere equipo TX/RX?	NO
EQUIPO A/C MINI SPLIT	
Existe equipo A/C mini split:	NO
¿Requiere equipo A/C mini split?	NO
ELECTROIMÁN 600 LB	
Existe electroimán 600 lb:	NO
¿Requiere electroimán 600 lb?	NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

SERVIDOR NVR	
Existe servidor NVR:	SI
Estado servidor NVR:	BUENO

Foto servidor NVR



¿Requiere servidor NVR?

SI

Cantidad servidor NVR (un):

1

LICENCIAS

Existen licencias:

SI

Foto licencias



11 jul 2026 2:34:46 p.m.
5.78997124N 75.78544738W
1-7 Carrera 7
Jericó
Antioquia
CCM JERICÓ

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

☐ MONITOR

Existe monitor:

SI


Cantidad monitor existente (un):

1

Estado monitor:

BUENO

Foto monitor

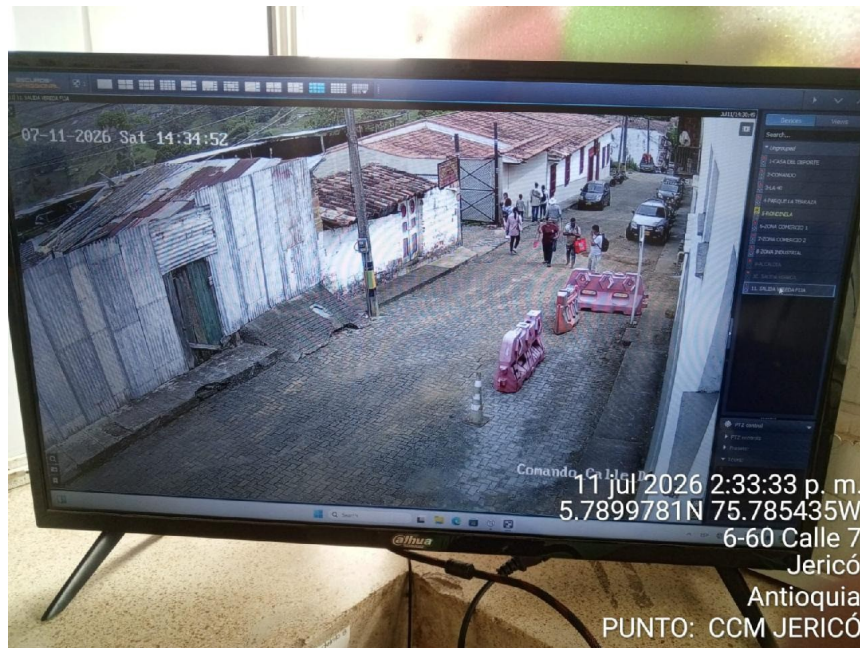

¿Requiere monitor?	SI
Tipo de monitor requerido:	MONITOR_55
Cantidad monitor 55" (un):	1
Observaciones monitor:	se requiere de 1 monitor de 55" para el nuevo CCM
ESTACIÓN DE TRABAJO	
Existe estación de trabajo:	NO
¿Requiere estación de trabajo?	SI
Cantidad requerida (un):	1
Observaciones estación de trabajo:	Se requiere de 1 estacion de trabajo
JOYSTICK DE OPERACIÓN	
Existe joystick de operación:	NO
CABLE HDMI	
Existe cable HDMI:	NO
¿Requiere cable HDMI?	SI
Cantidad requerida (un):	1
Observaciones cable HDMI:	se requiere de un cable de 10 metros
LUMINARIAS	
Existen luminarias:	NO
RED CONTRA INCENDIO	
Existe red contra incendio:	NO
PUERTAS	
Existen puertas:	NO
VENTANAS	
Existen ventanas:	SI
Estado ventanas:	BUENO
CONTROL DE ACCESO	
Existe control de acceso:	NO
CERRAMIENTO	
Existe cerramiento:	NO

7. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Código del ítem	OE06

Descripción de la actividad	SUM-OE06 Adquisición gabinete para equipos de red 42U
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se solicita traslado del CCM para un espacio mas adecuado para la instalacion de los equipos y visualizacion del CCTV, por ende se necesita de un rack de 42 U para albergar todos los equipos del CCM
Archivo APU adjunto	APU SUM-OE06 RACK 42U-9f4375a6557b462bbb9327fb5027c7b3.xlsx



ACTIVIDAD EXTRA 2	
Código del ítem	OE09
Descripción de la actividad	INST-OE09 Instalación gabinete para equipos de red 42U
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se solicita traslado del CCM para un espacio mas adecuado para la instalacion de los equipos y visualizacion del CCTV, por ende se necesita de un rack de 42 U para albergar todos los equipos del CCM
Archivo APU adjunto	APU INST-OE09 RACK 42U-77e6ce541272427c8937bb4d8950dc62.xlsx

Sin evidencia fotográfica

ACTIVIDAD EXTRA 3	
Código del ítem	OE01
Descripción de la actividad	INST-OE01 INSTALACIÓN DE CIRCUITO ELECTRICO EN CABLE 2N°12 + 1 N°12 AWG, THHN INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.
Unidad	ML
Cantidad	35
Justificación	Para el traslado del CCM es necesario la instalacion de 35 metros de un curcuito electrico
Archivo APU adjunto	APU INST-OE01 CIRCUITO ELECTRICO-84ef3df6566348e491448a31a61bf060.xlsx

Sin evidencia fotográfica

ACTIVIDAD EXTRA 4	
Código del ítem	OE02
Descripción de la actividad	INST-OE02 INSTALACIÓN DE BREAKER DE 15 - 30A ENCHUFABLE
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	se requiere de la instalacion de 1 Breaker de 20A para el circuito electrico
Archivo APU adjunto	APU INST-OE02 BREAKER-b4b2c327865c4198918e312ae77d3f51.xlsx

Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 5	
Código del ítem	OE04
Descripción de la actividad	INST-OE04 INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4"
Unidad	ML
Cantidad	60
Justificación	se requiere de la instalacionde 60 mts de tuberia EMT de 3/4 para llevar la FO y el circuito electrico
Archivo APU adjunto	APU INST-OE04 TUBERÍA EMT 3-4-9654b5d30d8e4661a3f77f172e01ae2f.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 6	
Código del ítem	OE11
Descripción de la actividad	INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLEADO EN RACK, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. .
Unidad	UN
Cantidad	4
Archivo APU adjunto	APU INST-OE11 ORGANIZADOR.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
¿Requiere mantenimiento?	SI
Tipo de mantenimiento:	PREVENTIVO
Tipo de mantenimiento preventivo:	COMPLETO
Observaciones generales del diagnóstico:	Se recomienda la reubicacion del CCM para un espacio mas seguro y que no este al aire libre y a la vista de los usuarios

9. CONTROL DE APROBACIÓN
