



**FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO
MANTENIMIENTO
Proyecto Tasa de Seguridad**



Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Jerico
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	12/08/2026
Dirección del punto / sector	Fonda La Terraza Parrilla Bar
Latitud	5.7919051391608924
Longitud	-75.78621673013292
Coordenadas formulario	-75.79_5.79

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	PVV 4 Parque La Terraza



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	RADIO_ENLACE
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernacion de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	SI
Seleccione el medio de comunicación a actualizar para	FO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	14MTS
Tipo de servicio	TELEMATICA
Dirección de referencia del anclaje	Carrera 4 con Calle 6
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tension	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Estado en el que se encuentra el anclaje:		BUENO
 12 jul 2026 7:09:49 a.m. 5.79198546N 75.78623912W 6-88 Carrera 4 Jericó Antioquia PARQUE PRINCIPAL		
Requiere Cambio de anclaje:		NO
GABINETE METÁLICO		
Existe Gabinete Metálico:		SI
Existe Gabinete Metálico:		REGULAR
 12 jul 2026 7:37:52 a. m. 5.791915N 75.78619W # 13 Calle 4 Jericó Antioquia PUNTO: PARQUE LA TERRAZA		
Requiere Gabinete Metálico:		No
Requiere Kit de Ventilación Doble:		NO
Observaciones Gabinete:		Se requiere cambio de gabinete, ya que el actual se encuentra deteriorado
CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO		
Existe Caja Distribución Vertical:		NO
Requiere Caja Distribución Vertical:		NO
INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA		

Existe Infraestructura Subterránea:	NO
Requiere Infraestructura Subterránea:	SI
Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:	CAJA_50X50_PROY
Observaciones Infraestructura Subterránea:	Se requiere de una caja de 50x50 para la puesta a tierra
CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	NO
Requiere Corona Antiescalatoria:	SI
Observaciones Corona:	El punto no cuenta con corona antiescalatoria
BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	BUENO
	
Requiere Brazo de Soporte:	NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen Cables:	SI
Estado Cables:	BUENO

Foto Cables



Requiere Cables:	NO
⚡ TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	SI
Estado Breaker:	BUENO
Requiere Breaker:	NO
💡 TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	NO
Requiere Transformador Reductor:	SI
Observaciones Transformador:	el punto no cuenta con transformador reductor
🔧 TUBERÍA	
Existe Tubería:	NO
Requiere Tubería:	NO
💧 CORAZA	
Existe Coraza:	NO
Requiere Coraza 3/4":	NO
🔌 UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS




12 jul 2026 7:52:32 a. m.
5.7919200000000001N 75.786155W
PUNTO: PARQUE LA TERRAZA

Requiere UPS:	NO
BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
Requiere SPT:	SI
PROTECCIÓN	
Existe Protección:	NO
Requiere Protección:	SI
Tipo de Protección requerida:	PROTECCION_ELECTRICA
Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un):	1
Observaciones Protección:	el punto no cuenta con DPS
TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO
Requiere Toma 125 V:	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	NO
Requiere Fibra Óptica:	NO
INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	SI
Estado Inyector PoE:	BUENO

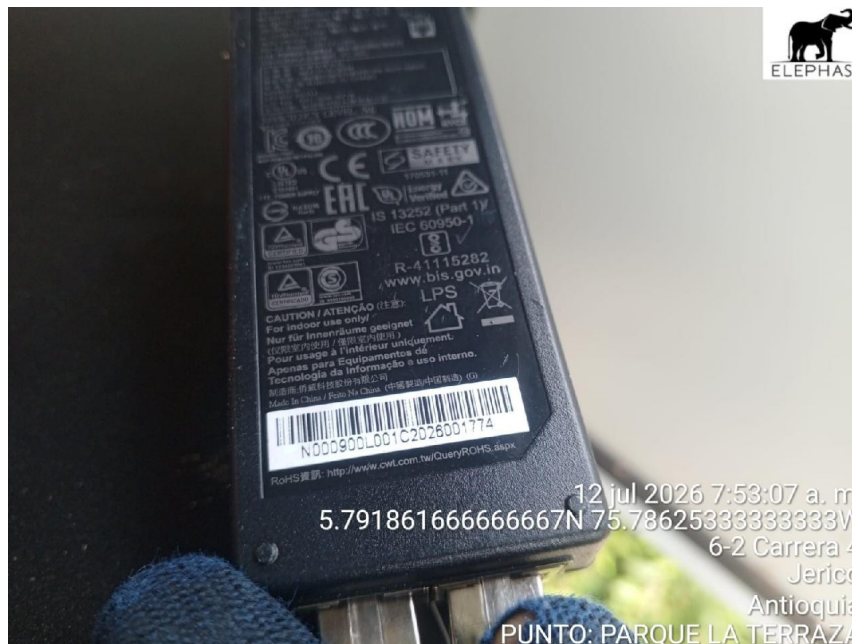

12 jul 2026 7:53:07 a. m.
5.791861666666667N 75.78625333333333W
6-2 Carrera 4
Jericó
Antioquia
PUNTO: PARQUE LA TERRAZA

Requiere Inyector PoE:	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	NO
Requiere Patch Cord:	NO
🔌 PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
🔄 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
📡 MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	NO
Requiere Módulo Óptico:	NO
🔌 SWITCH	
Existe Switch:	NO
Requiere Switch:	NO
📷 CÁMARA	
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	1
CÁMARA EXISTENTE 1	
Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	BUENO



¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
🌐 ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
📡 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	SI
Estado Equipo TX/RX:	BUENO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

🔧 ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Código del ítem	OE08
Descripción de la actividad	INST-OE08 Instalación gabinetes de poste/fachada, min 11U, NEMA 4
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere realizar el cambio del gabinete por averiacion del mismo
Archivo APU adjunto	APU INST-OE08 GABINETE-7683584d4de8409a9e72d0f4fdbdaf9.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 2	
Código del ítem	OE05
Descripción de la actividad	SUM-OE05 Adquisición gabinetes de poste/fachada
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere la instalacion de un gabinete nuevo
Archivo APU adjunto	APU SUM-OE05 GABINETE.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
----------------------------------	-------------

Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	Se requiere del cambio del gabinete, del suministro e instalacion de 1 transformador reductor, DPS, puesta a tierra y caja de 50X50

8. CONTROL DE APROBACIÓN
