



FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad



Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	La Pintada
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	12/08/2026
Vereda / sector	RAFAEL URIBE URIBE
Dirección del punto / sector	055060, La Pintada, Antioquia
Latitud	5.7365840209516525
Longitud	-75.6063211455484
Coordenadas formulario	-75.61_5.74

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	PVV 5 Calle Vieja



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	RADIO_ENLACE
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernación de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	SI
Seleccione el medio de comunicación a actualizar para	FO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Tipo de servicio	ENERGIA
Dirección de referencia del anclaje	Calle Vieja
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tension	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Estado en el que se encuentra el anclaje:		BUENO
 4 jul 2026 11:06:27 5.7367N 75.6064W LA PINTADA PVV27 - Fija Calle vieja 2		
Requiere Cambio de anclaje:		NO
GABINETE METÁLICO		
Existe Gabinete Metálico:		SI
Existe Gabinete Metálico:		REGULAR
 4 jun 2026 5:36:35 p. m. 5.736795000000001N 75.60633W 126° SE Autopista Conexión Pacífico 2 La Pintada Antioquia Altitud: 656.3msnm Velocidad: 0.4km/h CALLE VIEJA Número de índice: 206 ELEPHAS		
Requiere Gabinete Metálico:		No
Requiere Kit de Ventilación Doble:		NO
Observaciones Gabinete:		El Gabinete actual no cumple con el espacio suficiente para montar los
CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO		
Existe Caja Distribución Vertical:		SI
Estado de las Caja Distribución Vertical:		BUENO
Requiere Caja Distribución Vertical:		NO

📦 INFRAESTRUCTURA SUBTERRÁNEA	
Existe Infraestructura Subterránea:	NO
Requiere Infraestructura Subterránea:	SI
Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:	CAJA_50X50
Cantidad caja 50x50 requerida (un)	1
Observaciones Infraestructura Subterránea:	Se requiere caja de 50X50 para SPT
🛡️ CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	NO
Requiere Corona Antiescalatoria:	SI
🔧 BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	NO
Requiere Brazo de Soporte:	NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

🔌 ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen Cables:	SI
Estado Cables:	BUENO
Requiere Cables:	NO
⚡ TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	SI
Estado Breaker:	BUENO
Requiere Breaker:	NO
🔌 TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	NO
Requiere Transformador Reductor:	SI
Observaciones Transformador:	El punto no cuenta con transformador reductor
🔌 TUBERÍA	
Existe Tubería:	NO
Requiere Tubería:	NO
🛡️ CORAZA	
Existe Coraza:	SI
Estado Coraza:	BUENO
Requiere Coraza 3/4":	NO
🔌 UPS	
Existe UPS:	NO
Requiere UPS:	SI
Tipo de UPS requerida:	UPS_1_5
Observaciones UPS:	El punto requiere de UPS para respaldar los equipos
🔌 BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO
🌐 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
Requiere SPT:	SI
🛡️ PROTECCIÓN	
Existe Protección:	SI
Estado Protección:	BUENO
Requiere Protección:	NO
🔌 TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI

Estado Toma 125 V:	BUENO
Requiere Toma 125 V:	NO
✏ CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

🌐 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO
Requiere Fibra Óptica:	NO
Observaciones Fibra Óptica:	La FO fue implementada por el contrato de conectividad

🔑 INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	SI
Estado Inyector PoE:	BUENO



Requiere Inyector PoE:	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	SI
Estado Patch Cord:	BUENO
Requiere Patch Cord:	NO


🔌 PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO

📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO

🔄 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO

📡 MÓDULO TRANSCCEPTOR/TRANSCIEIVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	SI

Estado Módulo Óptico:	BUENO
Requiere Módulo Óptico:	NO
SWITCH	
Existe Switch:	SI
Estado Switch:	BUENO

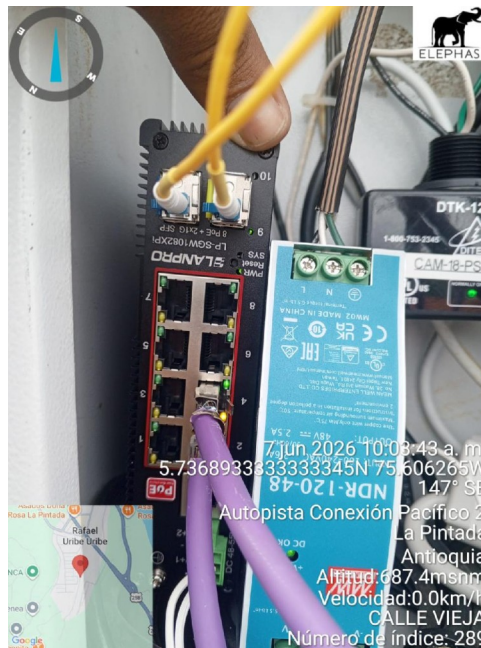

Requiere Switch:	NO
CÁMARA	
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	2
CÁMARA EXISTENTE 1	
Tipo de cámara	FIJA
Estado de la cámara	BUENO



CÁMARA EXISTENTE 2

Tipo de cámara	FIJA
Estado de la cámara	BUENO
  4 jun 2026 5:36:45 p. m. 5.736795000000001N 75.60632000000001W 136° SE Autopista Conexión Pacífico 2 La Pintada Antioquia Altitud:654.6msnm Velocidad:0.0km/h CALLE VIEJA Número de índice: 207	
¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	SI
Estado Equipo TX/RX:	BUENO
Requiere Equipo TX/RX:	NO
Observaciones Equipo TX/RX:	EL equipo debe ser desmontado, ya fue migrado a FO

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Descripción de la actividad	SUM-OE05 ADQUISICION GABINETES DE POSTE/FACHADA, min 11U
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	El Gabinete actual no cumple con el espacio suficiente para montar los equipos de manera funcional y organizada
Archivo APU adjunto	APU SUM-OE05 GABINETE.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 2	
Descripción de la actividad	INST-OE08 INSTALACIÓN GABINETES DE POSTE/FACHADA, min 11U
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	El Gabinete actual no cumple con el espacio suficiente para montar los equipos de manera funcional y organizada
Archivo APU adjunto	APU INST-OE08 GABINETE-19537409d0354359b0a42c558221ea38.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

ACTIVIDAD EXTRA 3	
Descripción de la actividad	INST-OE13 Instalación de corona antiescalatoria
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	el punto no cuenta con corona
Archivo APU adjunto	APU INST-OE13 CORONA-34bb37bff524456bb41d1ee08a1b0073.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	El punto se encuentra operativo, el gabinete es muy pequeño para albergar la UPS y organización de los cables internos

8. CONTROL DE APROBACIÓN
