

	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
---	---	--

Operador	UNION TEMPORAL VMAS SEGURIDAD 2024
Contrato disponible	170_2026
Técnico responsable	Santiago Carvajal Castaño
Cédula del técnico	1035229268


1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Yondó
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	13/08/2026
Dirección del punto / sector	Tesorería
Latitud	7.004506187807113
Longitud	-73.91051875320055
Coordenadas formulario	-73.91_7

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	Espejo CCM Secretaria de Gobierno

Evidencia ubicación CCM

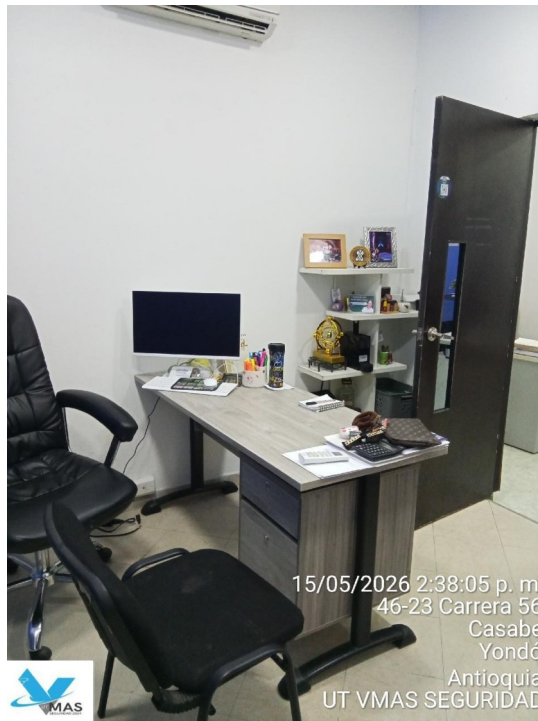

15/05/2026 2:38:05 p. m.
46-23 Carrera 56
Casabe
Yondó
Antioquia
UT VMAS SEGURIDAD

¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	MUNICIPIO
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO
Proveedor de la conexión del CCM:	Gobernacion
¿Requiere actualización de conexión?	NO

¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	SI
Otro uso del espacio del CCM:	Oficina de secretaria de gobierno
¿Personal de T.I. en sitio?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3

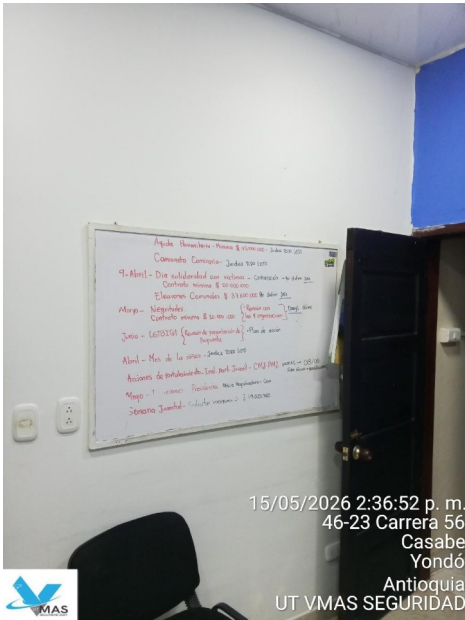


Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

 RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
 ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	NO
¿Requiere cables?	SI
Tipo de cable requerido:	3X12AWG,UTP_6
Cantidad cable 3x12 AWG (ml):	30
Cantidad cable UTP Cat. 6 (ml):	30
Observaciones cables:	Se requiere cable 3x12 awg para energizar el rack y UTP para la conexion de datos
 TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	SI
Estado tablero breaker:	BUENO
Existe breaker:	NO
¿Requiere breaker?	SI
Tipo de breaker requerido:	BRK_20A
Cantidad breaker (un):	1
Observaciones tablero breaker:	Para este CCM es necesario el breaker para la proteccion de la acometida electrica
 TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
 TUBERÍA	
Existe tubería:	NO
¿Requiere tubería?	SI
Tipo de tubería requerida:	EMT_3_4
Cantidad tubería EMT 3/4 (ml):	40
 CORAZA	
Existe coraza:	NO
¿Requiere coraza 3/4?	NO
 UPS	
Existe UPS:	NO
¿Requiere UPS?	SI
Tipo de UPS requerida:	UPS_1_5
 BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	NO
¿Requiere baterías UPS?	SI
Tipo de baterías UPS requeridas:	UPS_1_5
 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
¿Requiere SPT?	NO
 PROTECCIÓN	
Existe protección:	NO
¿Requiere protección?	NO
 PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	NO
¿Requiere PDU multitoma?	SI
Observaciones PDU multitoma:	Es necesario PDU multitoma horizontal de 8 entradas
 TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	NO
¿Requiere toma 125 V?	SI
Cantidad toma 125 V (un):	1
 CANAleta PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	NO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	NO

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

 PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA	
Existe punto físico de repetición:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
 PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	SI
Estado fibra óptica:	BUENO
¿Requiere fibra óptica?	NO
 ODF	
Existe ODF:	NO
¿Requiere ODF?	NO
 INYECTOR POE	
Existe inyector PoE:	NO
¿Requiere inyector PoE?	NO
 PATCH CORD	
Existe patch cord:	NO
¿Requiere patch cord?	SI
Observaciones patch cord:	Se necesita 1un patch cord de fibra optica monomodo y 1un de patch cord CAT 6A para estacion de trabajo
 PATCH PANEL	
Existe patch panel:	NO
¿Requiere patch panel?	NO
¿Requiere toma RJ45?	NO
 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe organizador de cableado:	SI
Estado organizador de cableado:	BUENO
¿Requiere organizador de cableado?	NO
 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe convertidor monomodo:	NO
¿Requiere convertidor monomodo?	NO
 MÓDULO TRANSCEPTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO	
Existe módulo óptico:	SI
Estado módulo óptico:	BUENO
¿Requiere módulo óptico?	NO
 SWITCH	
Existe switch:	NO
¿Requiere switch?	SI
Tipo de switch requerido:	SW_8P_IND
Cantidad switch (un):	1
 DISCO DURO	
Existe disco duro:	NO
¿Requiere disco duro?	NO
 FIREWALL	
Existe firewall:	NO
¿Requiere instalación de firewall?	NO
 ENRUTADOR VPN	
Existe enrutador VPN:	NO
 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe equipo TX/RX:	NO
¿Requiere equipo TX/RX?	NO
EQUIPO A/C MINI SPLIT	
Existe equipo A/C mini split:	SI
Estado equipo A/C mini split:	BUENO
¿Requiere equipo A/C mini split?	NO

ELECTROIMÁN 600 LB	
Existe electroimán 600 lb:	NO
¿Requiere electroimán 600 lb?	NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

SERVIDOR NVR	
Existe servidor NVR:	NO
¿Requiere servidor NVR?	NO
LICENCIAS	
Existen licencias:	NO

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

MONITOR	
Existe monitor:	SI
Cantidad monitor existente (un):	1
Estado monitor:	REGULAR
¿Requiere monitor?	NO
ESTACIÓN DE TRABAJO	
Existe estación de trabajo:	NO
¿Requiere estación de trabajo?	SI
Cantidad requerida (un):	1
JOYSTICK DE OPERACIÓN	
Existe joystick de operación:	NO
CABLE HDMI	
Existe cable HDMI:	NO
¿Requiere cable HDMI?	SI
Cantidad requerida (un):	1
LUMINARIAS	
Existen luminarias:	SI
Estado luminarias:	BUENO
RED CONTRA INCENDIO	
Existe red contra incendio:	NO
PUERTAS	
Existen puertas:	SI
Estado puertas:	BUENO
VENTANAS	
Existen ventanas:	NO
CONTROL DE ACCESO	
Existe control de acceso:	NO
CERRAMIENTO	
Existe cerramiento:	NO

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
¿Requiere mantenimiento?	NO
Observaciones generales del diagnóstico:	Este formulario para CCM es para un espejo que se propone como nuevo

9. CONTROL DE APROBACIÓN
